


Pågående produktionsarbeten för Swedbank Arena

Grundläggningsarbetena fortgår i arenans övriga delar och t.o.m. 1 oktober har Peab slagit ner 7 618 betongpålar i marken, gjutit 2 800 plintar, slagit och borrarat ner 277 stålrörspålar och gjutit 24 760 m² av betongplattan, totalt ca 22 000m³ betong.

Under oktober månad kommer Prefabmontage av södra kortändan att färdigställas. Montage fortsätter på västra och östra långsidorna + trapphus C. 2st stålbalkar på ca 600 ton/st monteras på innerplan. De kommer att lyftas till full höjd under v.42-43. Från södra sidan pågår utvändig fasad (klimatvägg), pågjutningar på bjälklag, stomkomplettering väggar och alla installationer el, rör, vent och sprinkler.

Arbetet kommer att genomföras i skift mellan kl 06.30-22.00 på vardagar samt mellan kl 07.00-16.00 på helger och viss bullerstörning kan förekomma.

För tillfället arbetar 250 yrkesarbetare, 57 tjänstemän och 9 lärlingar med projektet Swedbank Arena.

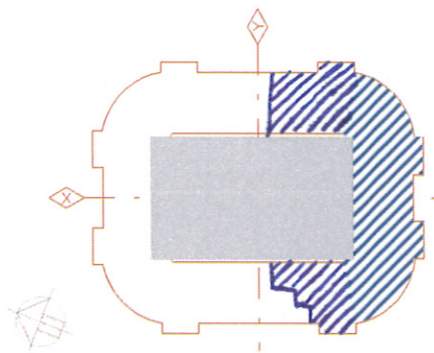

Oktober –
prefabmontage i
Arenans södra del
samt gjutning av
fotbollsplan.

PEAB INFORMERAR.*

ARENASTADEN

2010-10-01



2010-08-18



2010-10-01

Vid eventuella frågor, kontakta Peab (vxl) 08-623 68 00

Arenastaden - Skandinaviens främsta destination för evenemang, shopping, arbete, boende och rekreation. I stadsdelen kommer cirka 2 000 bostäder och 10 000 nya arbetsplatser att skapas.
