

## Pågående produktionsarbeten för Swedbank Arena


Grundläggningsarbetena fortgår i arenans norra delar och t.o.m. 1 januari har Peab slagit ner 7 703 betongpålar i marken, gjutit 3 175 plintar, slagit och borrarat ner 277 stålrörspålar och gjutit 36 389 m<sup>2</sup> av betongplattan, totalt ca 31 042m<sup>3</sup> betong.

Under januari månad kommer Prefabmontage fortsätta på västra och östra långsidorna + trapphus B. 4st stålbalkar på ca 600 ton/st monteras på innerplan. Balk 1 lyftes 13 november, ca 6 timmar lyfttid. Balk 2 lyftes 8 januari 2011. Från södra sidan pågår utvändig fasad (klimatvägg), pågjutningar på bjälklag, stomkomplettering väggar och alla installationer el, rör, vent och sprinkler.

Arbetstid vardagar kl:06.30-15.30 + kvällar till kl:20.00

Lördagar + söndagar kl:07.00-16.00

För tillfället arbetar 350 yrkesarbetare, 57 tjänstemän och 9 lärlingar med projektet Swedbank Arena.

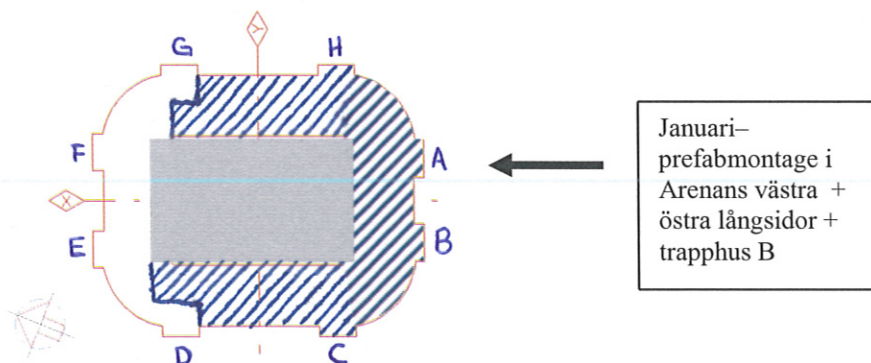

# PEAB INFORMERAR.\*

ARENASTADEN

2011-01-11



2011-01-11



2011-01-11



2011-01-11



2011-01-11

Vid eventuella frågor, kontakta Peab (vxl) 08-623 68 00

*Arenastaden - Skandinavien's främsta destination för evenemang, shopping, arbete, boende och rekreation. I stadsdelen kommer cirka 2 000 bostäder och 10 000 nya arbetsplatser att skapas.*
