

Pågående produktionsarbeten för Swedbank Arena


Grundläggningsarbetena fortgår i arenans norra delar och t.o.m. 8 december har Peab slagit ner 7 703 betongpålar i marken, gjutit 3 175 plintar, slagit och borrarat ner 277 stålörspålar och gjutit 31 500 m² av betongplattan, totalt ca 27 734m³ betong.

Under december månad kommer Prefabmontage fortsätta på västra och östra långsidorna + trapphus B. 3st stål balkar på ca 600 ton/st monteras på innerplan. Balk 1 lyftes 13/11, ca 6 timmar lyfttid. Balk 2 lyfts i Januari 2011. Från södra sidan pågår utvändig fasad (klimatvägg), pågjutningar på bjälklag, stomkomplettering väggar och alla installationer el, rör, vent och sprinkler.

Arbetstid vardagar kl:06.30-15.30 + kvällar till kl:20.00

Lördagar + söndagar kl:07.00-16.00

För tillfället arbetar 310 yrkesarbetare, 57 tjänstemän och 9 lärlingar med projektet Swedbank Arena.

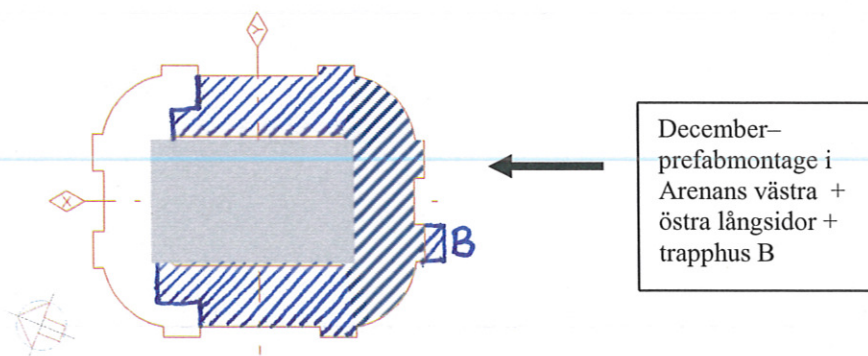

PEAB INFORMERAR.*

ARENASTADEN

2010-12-08



2010-12-08



2010-12-08



2010-12-08



2010-12-08

Vid eventuella frågor, kontakta Peab (vxl) 08-623 68 00

Arenastaden - Skandinaviens främsta destination för evenemang, shopping, arbete, boende och rekreation. I stadsdelen kommer cirka 2 000 bostäder och 10 000 nya arbetsplatser att skapas.
